宮古島市記者会見資料

航空自衛隊宮古島分屯基地で発見された地中構造物中の汚染水について（第６報）

令和８年 11 月４日
宮古島市環境衛生局

前回会見（10 月５日第５報）以降の経過は以下の通りです。

１　汚泥等の処分状況

10 月２３日時点での回収・搬出・処分状況は以下の通りです。

回収物	収容形態	回収済み	島外搬出済み	処分済み
汚染水等	IBC コンテナ（1 ㎥）	６個	６個	６個
汚泥等	ドラム缶（0.2 ㎥）	324 缶	296 缶	232 缶

※処分済み数量は、マニフェストＥ票により最終処分終了報告がなされた数量。

２　作業状況等

汚泥の除去作業が 10 月４日に完了しました。翌５日、床の水分を取り除いたところ、孔内に金属製と思われる管が確認されました。また、同日より地中構造物底版の孔をモルタルで塞ぎ、地中構造物内の洗浄を開始しました。人力による汚泥掻き取り作業の他、ポンプで洗浄水を回収しつつ洗浄機を使用しました。10 月９日に地中構造物内の洗浄を完了し、目視によりクラックのないことが確認されました。１０月 26 日には、市職員（地下水審議会学術部会の委員１名を含む。）による現場確認を行い、構造物の内部にも立入をいたしました。その後、10 月 28 日より、地中構造物周辺の土壌調査（4 箇所、深度 3.5m）を開始しているとのことです。

３　構造物の形状

汚泥の除去と構造物の洗浄により、新たに配管が確認されました（別紙の通り。）。上向きの配管は構造物直上で途切れており、土砂により閉塞しているとのことです。

４　今後の見通し

（１）12 月以降に土壌調査の検査結果が出る予定。

（２）構造物の底版より下、不透水性基盤までの土壌調査について検討予定。

本件に関するお問い合わせ先
宮古島市環境保全課　79-5283　課長 川満朝和
水道総務課　72-2653　課長 下地貞盛
沖縄防衛局報道室　098-921-8131（内 175, 176）

別紙

視察風景






別紙





別紙

外観

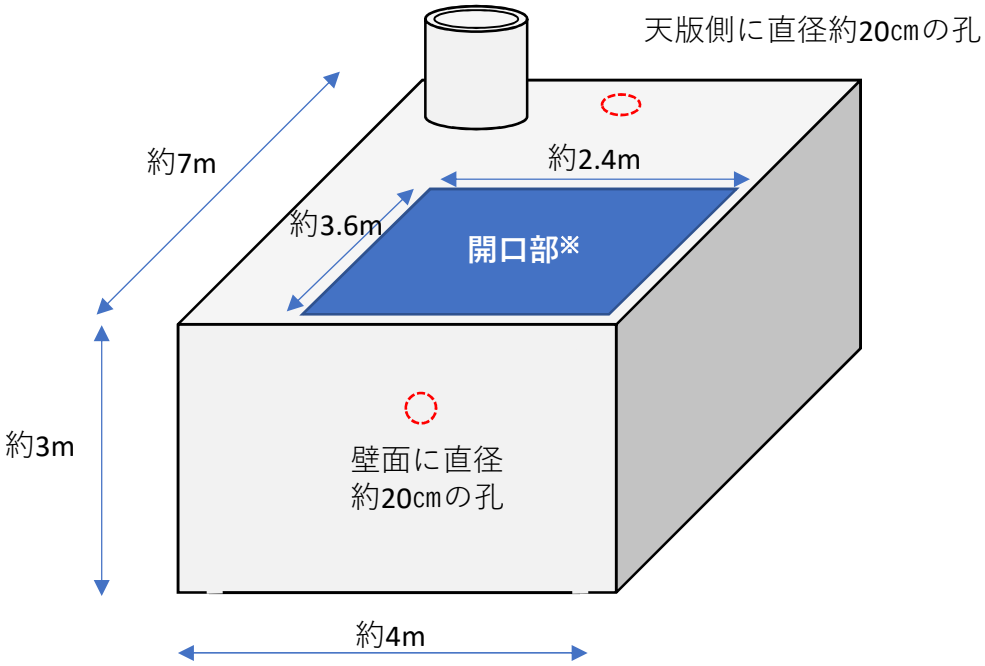

※開口部は、重機による汚水等の除去作業に必要な作業スペースを確保するため、構造物のコンクリートの一部を取り壊したもの。
作業時以外は、敷鉄板等で蓋をしている。

内部

